



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 331 del 29/06/2023

OGGETTO: LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" – ASSE VI POR FESR 2014-2020 SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° LOTTO – APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE – CUP C27H18003220006

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:

- con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili, che costituiscono la "Strategia Aree interne", mirata a sostenere aree ritenute "particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità";

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta DGR 5799 del 18 novembre 2016, ha individuato, in attuazione della "Strategia Nazionale Aree Interne" - due Aree Interne con riferimento ai territori di Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e Valli del Lario, per le quali procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità;

RICHIAMATE:

- la convenzione siglata il 19/05/2016 tra i Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana; Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola V., Dervio,

Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Introzzo, Vestreno, Tremenico, Vendrognò, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;

- la delibera approvazione delle "Determinazioni in ordine all'approvazione DEL PROGETTO D'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia" n. 2 assunta dall'Assemblea in data 27.02.2018 mediante la quale, tra l'altro, è stato disposto:
 - di sancire il rapporto di piena collaborazione del partenariato di progetto per la programmazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo per l'area interna in conformità a quanto già stabilito con la convenzione siglata il 19 maggio 2016 e richiamata in premessa;
 - di approvare il Documento di Strategia Area Interna dell'"Alto Lago di Como e Valli del Lario" comprensivo di:
 - Piano finanziario e piano indicatori risultati;
 - Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne);

DATO ATTO che:

- nel Documento di Strategia Area Interna dell'"Alto Lago di Como e Valli del Lario" è compresa la scheda 8.3 "In bici tra Lago e Monti" che comprende interventi di realizzazione, connessione, manutenzione e messa in sicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche ciclabile, del territorio;
- la Comunità Montana è stata individuata quale soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da Regione Lombardia a valere sulle risorse riservate alle aree interne dell'Asse VI POR FESR 2014-2020 ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e Vendrognò);

VISTI:

- la nota protocollo regionale n. A1.2018.0061879 del 17.04.2018, pervenuta il 10.07.2018 al protocollo n. 7474 della Comunità Montana, con la quale la Regione Lombardia ha confermato il finanziamento dell'importo di € 1.010.000,00= a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;
- l'Accordo Attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" composto da n. 10 articoli oltre alle premesse, corredato dal prospetto riassuntivo degli interventi e dei relativi impegni finanziari suddivisi per annualità di competenza nel triennio 2018/2020, approvato da questo Ente con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 91 del 12.09.2018 e sottoscritto da parte di tutti i Comuni;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 113 del 08/10/2019 avente ad oggetto "D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 ART. 21 – PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020-2021 DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA – ADOZIONE" che ricomprende tra gli interventi a programmazione anche la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda 8.3 – lotto II;
- la determinazione n. 270 del 13/08/2019 con la quale si aggiudicava il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e direttore operativo, coordinamento della sicurezza dei lavori di cui alla "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del Lago" - Asse VI POR FESR 2014-2020 - Scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" - 2° lotto: Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone", all'Ing. Luigi Bernardi con studio in Colico (LC), Via Villatico n. 12, C.F. BRNLGU53D21D590E - P.I. 01201620133, il quale ha offerto l'importo di € 21.850,00= oltre contributo integrativo 4% ed IVA del 22% per un importo complessivo di € 27.723,28=;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150 del 17/12/2019 con la quale sono stati approvati il quadro economico generale dell'opera dell'importo di € 1.200.000,00=, nonché i relativi sottoquadri riepilogativi delle voci di spesa per i singoli lotti funzionali, con conseguente trasmissione a Regione Lombardia per quanto di competenza in relazione al contributo concesso a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 4 del 21/01/2020 con la quale è stata approvata una prima rettifica dei quadri economici approvati con la precedente deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150/2019;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 45 del 17/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo denominato STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del Lago" - Asse VI POR FESR 2014-2020 - Scheda 8.3 " In bici tra lago e monti" - 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone" redatto dal tecnico incaricato Ing. Luigi Bernardi e presentato al protocollo n. 1510 in data 12.02.2020, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 702.000,00=;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 108 del 27/10/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico relativo al secondo lotto dell'intervento pari a complessivi € 702.000,00=, nonché è stata disposta la trasmissione a Regione Lombardia in relazione al finanziamento, dell'importo di € 1.010.000,00=, confermato con nota regionale n. A1.2018.0061879 del 17.04.2018, a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 124 del 01/12/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo in ragione del recepimento delle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, in merito alla sorveglianza archeologica di alcuni degli interventi previsti, in sede di conferenza dei servizi come da nota prot. n. 17046-P del 09/09/2020 - registrata al protocollo n. 8131 del 10/09/2020;
- la determinazione – prot. n. 7948 del 03/09/2020 - di conclusione POSITIVA della conferenza dei servizi, corredata dai pareri pervenuti;
- la deliberazione di Giunta esecutiva n. 73 del 15/06/2021 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo agli interventi in premessa, presentato al protocollo n. 5942 in data 15/06/2021, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 702.000,00=, di cui € 505.000,00= per lavori e € 197.000,00= a disposizione della stazione appaltante;

RICHIAMATE altresì:

- la determinazione n. 3/247 del 10/08/2021 con la quale sono state attivate le procedure di affidamento dei lavori "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone" mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 s.m.i. con invito rivolto a n. 5 operatori economici individuati tramite l'Elenco aperto degli operatori Economici qualificati per Provincia di Lecco, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi della piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA S.p.A.;
- la determinazione n. 3/339 del 29/10/2021 di aggiudicazione dei lavori sopracitati all'Impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc con sede in Via Valvarrone n. 42 – 23824 Dervio (LC) (C.F./P.IVA 01875090134), la quale, sull'importo a base d'asta di € 505.000,00= (€ 485.000,00= soggetti a ribasso ed € 20.000,00= per oneri della sicurezza), ha offerto un ribasso percentuale pari al 6,10%, aggiudicandosi la procedura all'importo di € 475.415,00= di cui € 455.415,00= per lavori ed € 20.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

DATO ATTO che:

- in data 19.11.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 30.11.2021 è stato sottoscritto il verbale di inizio dei lavori con effettivo inizio dei lavori;
- in data 07.12.2021 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 437 registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecco - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 19768 del 17/12/2021;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 3/441 del 22/12/2021 di autorizzazione al subappalto all'Impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc a favore della Ditta COSTRUZIONI BERTOLDINI SRL con sede a Premana (LC) in Via Risorgimento n. 34 (C.F./P.Iva n. 01315510139) degli interventi:
 - sentiero Ombrega-Ariale, in Comune di Casargo e Premana;
 - sentiero Artino-Lago degli asini-Bocca de ratt, in Comune di Premana;
 - sentiero Alpe Dolcigo-Fontanon, in Comune di Casargo, Crandola, Premana;come da contratto di subappalto depositato il 09/12/2021 prot. 12865, per un importo di € 197.000,00=, di cui € 6.000,00= per oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge, nell'ambito dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone", con incidenza percentuale del 42,70% rispetto all'importo contrattuale;
- la determinazione n. 3/62 del 18/02/2022 di autorizzazione al subappalto a favore della Ditta BETTIGA COSTRUZIONI SRL con sede in Colico (LC), Via Campera n. 12, C.F. e P.IVA 03004800136 per la realizzazione di murature e pavimentazioni in pietra in Comune di Dervio, come da contratto di subappalto depositato il 11/02/2022 al nostro prot. n. 1581, per un importo di € 30.000,00=, di cui € 900,00= per oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge, nell'ambito dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone", con incidenza percentuale del 6,31% rispetto all'importo contrattuale;
- la determinazione n. 3/149 del 20/04/2022 di integrazione al subappalto a favore della Ditta BETTIGA COSTRUZIONI SRL con sede in Colico (LC), Via Campera n. 12, C.F. e P.IVA 03004800136 per la realizzazione di murature e pavimentazioni in pietra in Comune di Dervio, come da contratto di subappalto depositato il 07/04/2022 al nostro prot. n. 3585, per un importo di € 8.200,00=, di cui € 240,00= per oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge, nell'ambito dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone", con incidenza percentuale del 1,72% rispetto all'importo contrattuale;
- la determinazione n. 3/248 del 29/06/2022 di approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 21/04/2022, pervenuto il 20/05/2022 al prot. n. 5000, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Bernardi, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc con sede in Via Valvarrone n. 42 – 23824 Dervio (LC) (C.F./P.IVA 01875090134), dell'importo di € 90.300,00=, al netto del ribasso oltre IVA 22% per complessivi € 110.166,00=;
- la determinazione n. 3/365 del 22/09/2022 di approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 05/08/2022, pervenuto il 15/09/2022 al prot. n. 9150, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Bernardi, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc con sede in Via Valvarrone n. 42 – 23824 Dervio (LC) (C.F./P.IVA 01875090134),

dell'importo di € 180.900,00=, al netto del ribasso oltre IVA 22% per complessivi € 220.698,00=;

- la determina n. 3/442 del 14/11/2022 di affidamento della progettazione di variante in corso d'opera all' Ing. Luigi Bernardi di Colico (LC) al fine di consentire la realizzazione delle lavorazioni e il completamento dell'opera necessari, introducendo alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto, principalmente dovute allo spostamento di alcuni interventi per una maggior funzionalità;

RICHIAMATA infine la determinazione n. 3/272 del 06/06/2023 di approvazione della Contabilità Finale del 29/05/2023, pervenuta in data 30/05/2023 al prot. n. 6048, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Bernardi, e sottoscritto senza riserve in data 29/05/2023 dall'Impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc di Dervio (LC);

CONSIDERATO che con l'approvazione della contabilità sono stati liquidati i crediti spettanti alla ditta e ai professionisti incaricati;

DATO ATTO che, con riferimento al progetto della "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESRT 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° LOTTO: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone" sono stati raggiunti i target previsti e realizzate le opere in progetto con una spesa effettivamente sostenuta pari a € 633.805,90=, come si evince dalla relazione finale sulle attività svolte e dal piano finanziario allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione della relazione finale e del piano finanziario dai quali risulta la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, al fine del successivo inoltro della richiesta di saldo del finanziamento a Regione Lombardia;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

RICHIAMATI in merito:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017;
- il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare, con riferimento al progetto della "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESRT 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° LOTTO: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone", la relazione finale sulle attività svolte ed il piano finanziario, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si evincono nel dettaglio i target raggiunti e la spesa complessiva effettivamente sostenuta pari all'importo di € 633.805,90=.
2. Di provvedere alla trasmissione a Regione Lombardia della richiesta di erogazione di saldo del finanziamento per la chiusura dell'intervento mediante trasmissione, oltre al resto della

documentazione prevista, anche della presente determinazione con i relativi allegati come sopra approvati.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 331 del 29/06/2023

**OGGETTO: LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DELL'AREA INTERNA
"ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" – ASSE VI POR FESR
2014-2020 SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° LOTTO –
APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE – CUP C27H18003220006**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Note:

Barzio, lì 29/06/2023

IL RESPONSABILE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Nr. **331** del 29/06/2023

OGGETTO:	LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" – ASSE VI POR FESR 2014-2020 SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° LOTTO – APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE – CUP C27H18003220006
----------	--


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio li, 05/07/2023

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



COMUNITÀ MONTANA

VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

23816 BARZIO (Lecco) – Via Fornace Merlo, 2

Tel. 0341.910144 – Fax 0341.910.154


Codice Fiscale 01409210133

Settore Tecnico – U.O 3 Turismo, Sport e Tempo Libero

Aree Interne POR FESR 2014-2020 Asse VI “Strategia turistica delle Aree Interne” Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario - intervento ID 1769406 n. 8.3 Lotto 2 C.U.P. N. C27H18003220006

Comuni interessati:

Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone.

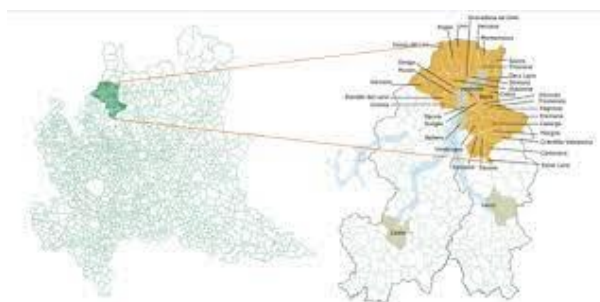

RELAZIONE FINALE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE

Giugno 2023

Settore Tecnico - U.O 3 Turismo, Sport e Tempo Libero

ID SIAGE: 1769406

Soggetto attuatore: COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA


Importo totale progetto: € 702.000,00

Contributo assegnato da Regione Lombardia (DDUO 4037 del 24 marzo 2021): € 595.000,00;

Contributo rideterminato a seguito delle procedure di affidamento (DDUO 17779 DEL 3/12/2022): € 559.982,98;

Codice CUP: C27H18003220006

Premessa

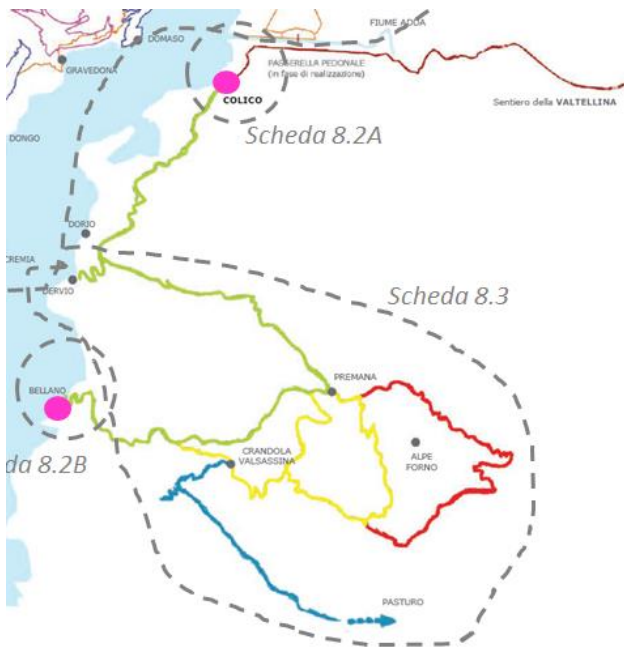

L'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione della Strategia d'area interna "Alto Lago di Como e Valli del Lario", approvato da Regione Lombardia con DGR XI/331 del 30/06/2020, prevede tra gli interventi cofinanziati sull'Asse VI POR FESR Regione Lombardia 2014/2020 la scheda **8.3 In bici tra lago & monti** (ID 704525).

L'intervento fa parte di una progettualità più ampia, finalizzata alla realizzazione, raccordo, integrazione e messa in sicurezza di percorsi cicloturistici nel territorio dell'Alto Lago di Como e Valli del Lario.

L'intervento, legato al 2° lotto, ha previsto il potenziamento dei percorsi, con diversi livelli di difficoltà, nei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone.

Il progetto definitivo relativo all'intervento "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESRT 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone" è stato approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana con deliberazione n. 45 del 17/06/2020 redatto dal tecnico incaricato Ing. Luigi Bernardi e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 702.000,00= di cui € 595.000,00= finanziati da Regione Lombardia a valere su Fondi Asse VI POR FESR 2014-2020 ed € 107.000,00= con fondi propri dei Comuni interessati;

A seguito della conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, conclusasi in data 03/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESRT 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone" dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana con Deliberazione n. 73 del 15/06/2021, redatto dal progettista incaricato Ing. Luigi Bernardi e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 702.000,00=.

Obiettivi e finalità

L'area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario si sviluppa a cavallo tra le province di Como e di Lecco, estendendosi dalle sponde lacuali alle Valli più interne, ricomprendendo i comuni della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone Val d'Esino e Riviera di: Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola

V., Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno e Valvarrone.

L'area è caratterizzata da una fascia rivierasca incuneata tra le montagne delle Prealpi, che si dirama verso monte con vallate parallele tra loro. Un contesto che, nel suo insieme, è accomunato dalla presenza di indiscutibili valenze paesaggistiche, naturali e culturali, con piccoli borghi lungo le sponde e a mezza quota.

Il **potenziale turistico** di questo territorio rappresenta oggi una crescente componente del suo sistema economico, carente nella sua valorizzazione, in particolare per quelle località interne, di mezza costa e delle valli, storicamente più deboli e meno organizzate da un punto di vista dell'accoglienza turistica, rimaste ai margini dei principali flussi turistici, ma che, in conseguenza alle ristrettezze dovute alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, stanno vivendo una fase di riscoperta legata a modelli di turismo di prossimità.

Il settore turistico rappresenta un segmento importante dell'economia della fascia lacuale, mentre vi sono ampi margini di miglioramento e di sviluppo nelle aree più interne, di mezza costa e vallive.

La Strategia d'area mira, quindi, a potenziare le relazioni territoriali tra lago e valli, in un'ottica integrata e di sistema, che permetta al tempo stesso di:

- **Diversificare e ampliare le proposte di visita**, andando ad intercettare segmenti differenti rispetto a quelli tradizionali;
- Sostenere uno **sviluppo maggiormente equilibrato tra i diversi contesti locali**;
- Incrementare la **capacità di promozione e valorizzazione integrata delle risorse**, innescando un sistema di rimandi e di interazioni tra i poli principali (culturali, ambientali, paesaggistici) e il patrimonio identitario minore diffuso sul territorio (piccoli borghi, alpeggi, chiese, ...);
- contribuire ad **incrementare le presenze turistiche** nella fascia montana, assicurando una percorrenza tra lago e montagna e mettendo a regime una maglia di tracciati e itinerari che permetta di scoprire il territorio.

L'obiettivo della Strategia, e nel dettaglio quello della scheda 8.3, è infatti quello di valorizzare una serie di risorse già presenti, rispetto ai quali intervenire con azioni di recupero e riqualificazione sul fronte infrastrutturale, potenziando gli itinerari ciclabili ed escursionistici tra lago e valli.

Sono state tracciate 4 proposte che si sviluppano con diversi livelli di difficoltà interessando l'intero ambito, tali percorsi consentono di risalire dal Lago verso la Valsassina e valorizzando i tracciati sul Monte Legnoncino, realizzando circuiti ad anello nell'Alta Valsassina, raccordi con la ciclabile della Valsassina e valorizzando i percorsi della Val d'Esino.

La valorizzazione di tali percorsi mediante la manutenzione straordinaria dei tracciati è volta ad integrare la rete dei percorsi e la loro sicurezza, con una riduzione delle situazioni di pericolo esistenti per gli utenti, ciclisti e o pedoni, che ora utilizzano le strade statali e provinciali, articolando gli itinerari in modo che permettano di raggiungere punti di interesse culturale, ambientale e storico, arricchendo così l'esperienza di visita del territorio.

Alcuni percorsi proposti sono ampiamente fruibili per buona parte dell'anno, contribuendo quindi ad una destagionalizzazione della fruizione in particolare nei periodi autunnali e primaverili.

Al termine dei lavori sono stati pienamente raggiunti tutti gli obiettivi di progetto.

Realizzazione degli interventi

I lavori sono stati aggiudicati con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante la consultazione di n. 5 operatori economici individuati tramite l'Elenco Fornitori Telematico qualificati per l'Ente all'interno della Piattaforma Sintel di ARIA Regione Lombardia, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", indetta con determinazione n. 3/247 del 10/08/2021.

L'affidamento è avvenuto con determinazione n. 3/339 del 29/10/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori della "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESRT 2014-2020 – SCHEDE 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone" a favore dell'impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc con sede in Via Valvarrone n. 42 – 23824 Dervio (LC) (C.F./P.IVA 01875090134), la quale ha offerto un ribasso del 6,10% sull'importo a base d'asta, determinando l'importo di € 475.415,00= di cui € 455.415,00= per lavori ed € 20.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, per complessivi € 580.006,30=.

In data 19/11/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

In data 07/12/2021 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 437 registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecco - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 19768 del 17/12/2021;

Con determinazione n. 3/272 del 06/06/2023 è stata approvata la Contabilità Finale dei lavori del 29/05/2023, pervenuta in data 30/05/2023 al prot. n. 6048, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Bernardi, e sottoscritto senza riserve in data 29/05/2023 dall'Impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc di Dervio (LC), per un importo di € 446.719,24=, oltre oneri della sicurezza per € 20.000,00= ed iva per complessivi € 569.397,47=.

Nell'ambito del progetto sono state anche installate n. 6 colonnine di ricarica per E-Bike Station, di cui 1 in Comune di Dervio - area comunale, 3 in Comune di Valvarrone - Località Vestreno, Località Subiale e Località Avano, 1 in Comune di Premana - Località Artino e 1 in Comune di Casargo - Località Ombrega.

Spesa complessivamente sostenuta

SOGGETTO	IMPORTO LIQUIDATO	TIPOLOGIA DI SPESA
Bonazzola Pepino e Figlio di Bonazzola Giuseppe & C. snc	569.397,47 €	opere
Adriana Beatrice Briotti	2.600,00 €	spese tecniche
Bernardi Luigi	34.619,24	spese tecniche
Dipendenti CM	6.471,01 €	spese tecniche
SoilData Studio Associato	4.666,50 €	spese tecniche
Davide Grosso	2.030,08 €	spese tecniche
Franco Martin	11.712,00 €	acquisto beni/forniture
E-DISTRIBUZIONE SPA	1.812,60 €	acquisto beni/forniture
ANAC	375,00 €	Pubblicità
Grafiche Cola srl	122,00 €	Pubblicità
TOTALE	633.805,90 €	

Indicatori di risultato

In coerenza con gli indicatori del POR FESR Asse VI 2014-2020 di Regione Lombardia, il progetto ha previsto il raggiungimento dei seguenti target:

<i>Indicatore</i>	<i>Km (lineari) realizzati</i>
Target di progetto	2,8
Obiettivo raggiunto	2,8

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Dott. Ing. Davide Maroni



*Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005.*

ALLEGATO: ELENCO SPESE SOSTENUTE

8.3 LOTTO 2 - TOTALE SPESE RENDICONTATE

#	Tipologia di documento	Numero del documento	Data documento	Denominazione fornitore	Importo del documento	Totale quietanzato	Totale rendicontato - dichiarato	voce di spesa
1	Fattura	FATTPA 1_20	06/03/2020	Luigi Bernardi	10.150,40 €	10.150,40 €	10.150,40€	spese tecniche
2	Fattura	FATTPA 7_22	23/05/2022	Luigi Bernardi	8.881,60 €	8.881,60 €	8.881,60€	spese tecniche
3	Fattura	FATTPA 10_22	15/09/2022	Luigi Bernardi	5.075,20 €	5.075,20 €	5.075,20€	spese tecniche
4	Fattura	FATTPA 2_20	10/03/2020	SoilData Studio Associato	933,30 €	933,30 €	933,30€	spese tecniche
5	Fattura	FATTPA 2_21	19/05/2021	SoilData Studio Associato	3.733,20 €	3.733,20 €	3.733,20€	spese tecniche
6	Fattura	FATTPA 1_20	03/04/2020	Adriana Beatrice Briotti	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00€	spese tecniche
7	Altro	cedolino aprile 2022	19/04/2022	Amanti Raffaella	2.522,00 €	2.522,00 €	315,25€	spese tecniche
8	Altro	cedolino aprile 2022	19/04/2022	Bertarini Tecla	2.522,00 €	2.522,00 €	315,25€	spese tecniche
9	Altro	cedolino aprile 2022	19/04/2022	Brambilla Elisabetta	2.522,00 €	2.522,00 €	315,25€	spese tecniche
10	Altro	cedolino aprile 2022	19/04/2022	Marcati Alice	2.522,00 €	2.522,00 €	315,25€	spese tecniche
11	Altro	cedolino aprile 2022	19/04/2022	Maroni Davide	2.522,00 €	2.522,00 €	1.261,00€	spese tecniche
12	Altro	cedolino novembre 2021	19/11/2021	Nogara Silvia	300,00 €	300,00 €	300,00€	spese tecniche
13	Altro	cedolino novembre 2021	19/11/2021	Benedetti Maria	300,00 €	300,00 €	300,00€	spese tecniche
14	Fattura	FATTPA 9_22	05/07/2022	Bonazzola Pepino e Figlio di Bonazzola Giuseppe & C. snc	110.166,00 €	110.166,00 €	110.166,00€	opere
15	Fattura	FATTPA 15_22	16/09/2022	Bonazzola Pepino e Figlio di Bonazzola Giuseppe & C. snc	220.698,00 €	220.698,00 €	220.698,00€	opere
16	Fattura	14/001	02/03/2022	Franco Martin	11.712,00 €	11.712,00 €	11.712,00€	acquisto ben/forniture
17	Fattura	9,229E+11	11/08/2022	E-DISTRIBUZIONE SPA	549,33 €	549,33 €	549,33€	acquisto ben/forniture
18	Fattura	9,229E+11	11/08/2022	E-DISTRIBUZIONE SPA	549,33 €	549,33 €	549,33€	acquisto ben/forniture
19	Fattura	9,219E+11	01/06/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	356,97 €	356,97 €	356,97€	acquisto ben/forniture
20	Fattura	9,219E+11	01/06/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	356,97 €	356,97 €	356,97€	acquisto ben/forniture
21	Altro	MA-21-0001792	19/10/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00 €	375,00 €	375,00€	spese pubblicità
22	Fattura	FATTPA 9_23	18/04/2023	Luigi Bernardi	6.895,96 €	6.895,96 €	6.895,96€	spese tecniche
23	Fattura	FATTPA 12_23	05/06/2023	Luigi Bernardi	3.616,08 €	3.616,08 €	3.616,08€	spese tecniche
24	Fattura	55/E	31/05/2023	Davide Grosso	2.030,08 €	2.030,08 €	2.030,08€	spese tecniche
25	Altro	cedolino giugno 2023	08/06/2023	Amanti Raffaella	3.298,00 €	3.298,00 €	412,25€	spese tecniche
26	Altro	cedolino giugno 2023	08/06/2023	Bertarini Tecla	3.298,00 €	3.298,00 €	412,25€	spese tecniche
27	Altro	cedolino giugno 2023	08/06/2023	Brambilla Elisabetta	3.298,00 €	3.298,00 €	412,25€	spese tecniche
28	Altro	cedolino giugno 2023	08/06/2023	Marcati Alice	3.298,00 €	3.298,00 €	412,25€	spese tecniche
29	Altro	cedolino giugno 2023	08/06/2023	Maroni Davide	3.298,00 €	3.298,00 €	1.649,01€	spese tecniche
30	Fattura	FATTPA 14_23	31/05/2023	Bonazzola Pepino e Figlio di Bonazzola Giuseppe & C. snc	238.533,47 €	238.533,47 €	238.533,47€	opere
31	Fattura	150	30/05/2023	Grafiche Cola srl	122,00 €	100,00 €	122,00€	spese pubblicità
32	Altro	cedolino novembre 2021	44519	Benedetti Maria	600	600	51,00€	spese tecniche

TOTALE RENDICONTATO

633.805,90 €
